



Protocol testen VU W&N gebouw

Voor de renovatie van de AB-vleugel van het W&N gebouw zal aannemer Dura Vermeer verschillende testen uitvoeren ter voorbereiding op deze renovatie. Dit zal gaan om een test voor de dekvloeren in de AB-vleugel, het demonteren van de tegels op de trap in vleugel T en het demonteren van plafonddelen in de C-vleugel.

Datum en tijdstip uit te voeren werkzaamheden:

Test	Datum	Tijdstip	Duur
Boringen dekvloer AB-Vleugel	Maandag 30 oktober 2023	Start 07:00 uur	+ - 2 uur
Demontage tegel traprede T- vleugel	Maandag 30 oktober 2023	Start 09:00 uur	+ - 2 uur
Plafond delen t.b.v. meting C- vleugel hal en trappenhuis	Maandag 30 oktober t/m woensdag 1 november 2023	Start 07:00 uur	+ - 3 dagen

Hieronder staat een verdere beschrijving van de werkzaamheden:

Dekvloer AB-vleugel

In de AB-vleugel zullen verschillende boring op de kelderverdieping, de begane grond en de eerste verdieping uitgevoerd worden. Deze boringen zijn nodig om de dikte van de dekvloeren te bepalen en zullen enkel daarom door de dekvloer gaan. De boringen zullen niet door-en-door uitgevoerd worden, wat overlast zal beperken.

Om overlast zoals trillingen, stof en geluid te voorkomen zal er geboord worden met een boor met een kleine diameter. Daarnaast zullen de boringen vroeg in de ochtend uitgevoerd worden en zullen de werkzaamheden ongeveer 2 uur duren.

Op de locaties in het gebouw die nog in gebruik zijn, zullen de gaten dicht gesmeerd worden met snel plamuur. Hierdoor zal de vloer weer gelijk zijn en is hij weer veilig om te gebruiken.

Demontage tegelvloer trap T-vleugel

In de nieuwe AB-vleugel willen we gebruik maken van een hergebruikte tegelvloer afkomstig uit het te slopen W&N gebouw. Om deze ambitie waar te maken zullen wij een test uitvoeren voor het demoteren van de tegelvloer in trappenhuis T. Dit zal gebeuren op de 4^e – 5^e verdieping om zoveel mogelijk overlast te voorkomen.

Voor de test zullen er tegels gedemonteerd worden van een gehele trap treden. Naderhand zal deze trap treden een andere aftimmering krijgen, zodat hij na de test gewoon veilig betreden kan worden. Weer zal deze test vroeg in de ochtend uitgevoerd worden en op dezelfde dag als de dekvloer test.

Plafond delen C-vleugel

Voor de renovatie moeten erop de verdieping bij de C-vleugel metingen gedaan worden voor de plaatsing van de nieuwe gevel. Hiervoor zal in de hal van de C-vleugel enkele plafond platen gedemonteerd worden. Deze zullen na de meting die ongeveer drie dagen duren weer terug geplaatst worden. Qua overlast verwachten wij dat er geen trillingen aanwezig zullen zijn, enkel beperkt geluid wellicht.



legenda
-Alle maten in het werk te controleren. Terreinmaten zijn indicatief
-Alle maten in mm
-Arcering volgens NEN 47
-Tekening volgens documentenlijst 1239 S02
-Materialcodes vgs. behorende materiaalstaat 1239 S05 of bestekboek
-Materialcodes gelden voor het gehele vlak, tenzij anders aangegeven.
-Pe 0 = bovenkant afgewerkte begane grondvloer = XXX- NAP
-Grondwaterstand XXX- NAP, bron: XXX, d.d.DDMMLJJJ
-Eventueel getekende losse inrichting valt buiten het bouwkundig bestek, tenzij anders aangegeven.
-Vooroppervlaktes volgens NEN 2560
-Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten, vrije doorgang en drempelhoogten voldoen aan de eisen zoals vermeld in onderstaande ark
-Projecten vergund volgens Bouwbesluit 2012: art. 4.21, 4.22 en 4.27
-Projecten vergund volgens BBL: Bestaande bouw: art. 3.59 en 3.59a
-maatvoering vloerpakketten ter plaatse van de vloer
-te openen ramen en deuren met een draaihoek van 90°
-scheiding 30 minuten WBDO
-scheiding 60 minuten WBDO
-ruimte scheiding
maximaal toelaatbare totale tolerantie constructie in aangegeven richting
materialen uitlijnen (voorkant = voorkant, flush)
materiaalcode: XXX.XX.YY (XX,XX=NL-SIB code, YY=volnummer)
kozijnmerk: X.YYY.ZZZ (X=soort, YYY=type, ZZZ=volnummer)
bestaande onderdelen
buiten bestek
installatietechnische componenten, voor alle installatietechnische specificaties, tekeningen en berekeningen zie documenten installatie adviseur
loopdeur indicatie
(L)

kelder verdieping

O = locatie boring

uitgevoerd op maandag 16 oktober
om 07:00 uur

CONCEPT

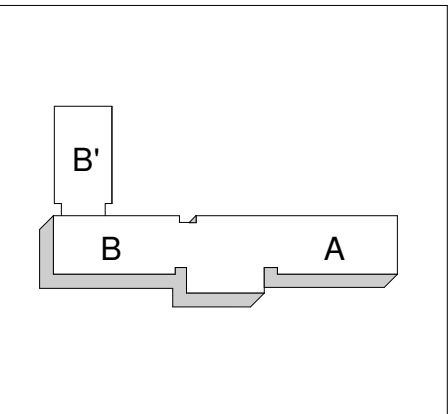


architectenbureau
cepezed b.v.
ezelsveldlaan 61
2611 tv delft nl
t +31 15 215 0000
post@cepezed.nl
www.cepezed.nl

opdrachtgever
cepezed
werk
VU AB vleugel
fase
definitief ontwerp
datum
24-04-2023
schaal
1:100
formaat
A1XL2
getekend
tan
gecontroleerd
ivo
gewijzigd

tekening
kelder

1239
L(--)
02

cepezed

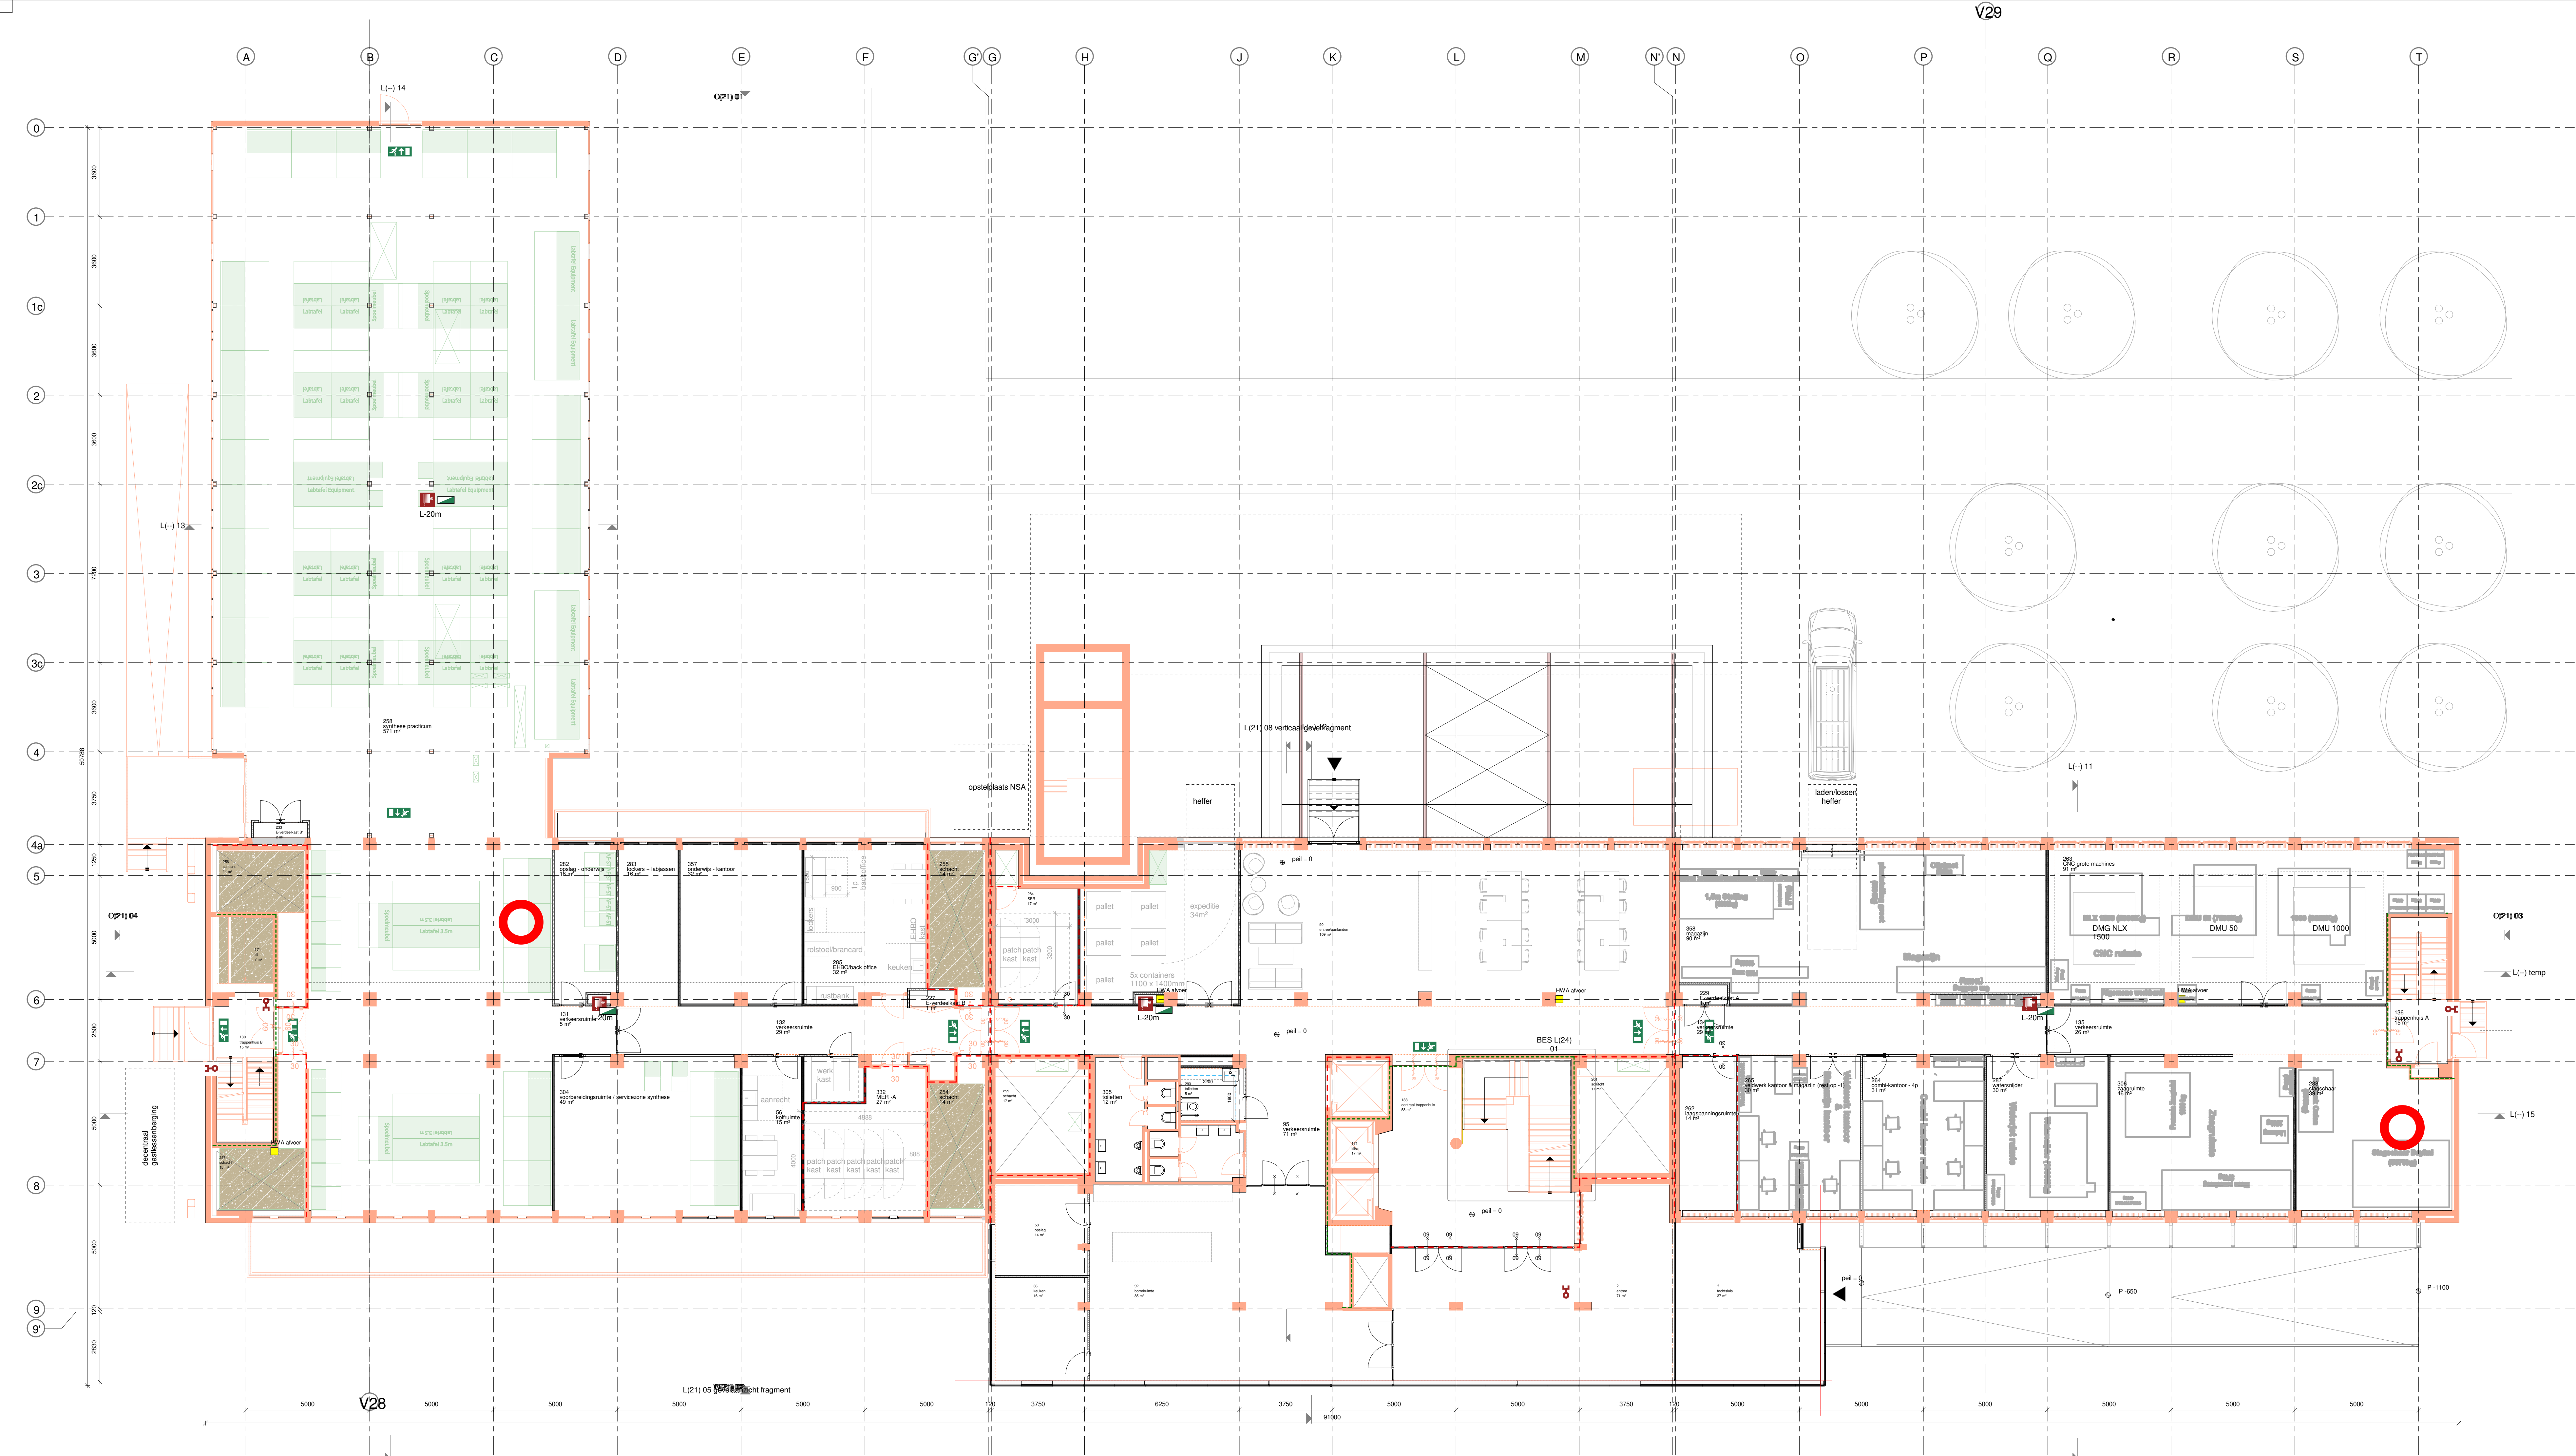

- legenda**
- Alle maten in het werk te controleren. Terreinmaten zijn indicatief
 - Alle maten in mm
 - Arcering volgens NEN 47
 - Tekening volgens documentenlijst 1239 S02
 - Materiaalcodes vops bijbehorende materiaalstaat 1239 S05 of bestekboek
 - Materiaalcodes gelden voor het gehele vlak, tenzij anders aangegeven.
 - P= 0 = bovenkant afgewerkte begane grondvloer = XXX+ NAP
 - Grondwaterstand XXX+ NAP, bron: XXX, d.d.DDMMJJJJ
 - Eventueel getekende losse inrichting valt buiten het bouwkundig bestek, tenzij anders aangegeven.
 - Vooropervaktes volgens NEN 2560
 - Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten, vrije doorgang en drempelhoogten voldoen aan de eisen zoals vermeld in onderstaande ark
 - Projecten vergund volgens Bouwbesluit 2012: art. 4.21, 4.22 en 4.27
 - Projecten vergund volgens BBL: Bestaande bouw: art. 3.59 en 3.59a
 - maatvoering vloerpakketten ter plaatse van de vloer
 - Te openen ramen en deuren met draai- en/of schuifmechanisme
 - scheiding 30 minuten WBBO
 - scheiding 60 minuten WBBO
 - ruimte scheiding
 - maximaal toelaatbare totale tolerantie constructie in aangegeven richting
 - materialen uitlijnen (voorkant = voorkant, flush)
 - materiaalcode: XX.XX.YY (XX.XX=NL-SIB code, YY=volgnummer)
 - kozijnmerk: X.YYY.ZZZ (X=soort, YYY=type, ZZZ=volgnummer)
 - bestaande onderdelen
 - buiten bestek
 - installatietechnische componenten, voor alle installatietechnische specificaties, tekeningen en berekeningen zie documenten installatie adviseur
 - loopdeur indicatie

begane grond

○ = locatie boring

uitgevoerd op maandag 16 oktober om 07:00 uur

CONCEPT

architectenbureau
cepezed b.v.

eizelsveldlaan 61
2611 tv delft nl
t +31 15 215 0000

post@cepezed.nl
www.cepezed.nl

opdrachtgever
cepezed

werk
VU AB vleugel

fase
definitief ontwerp

datum
24-04-2023

schaal
1:100

formaat
A1XL2

getekend
tan

gecontroleerd
pro

gewijzigd




- legenda**
- Alle maten in het werk te controleren. Terreinmaten zijn indicatief
 - Alle maten in mm
 - Arcering volgens NEN 47
 - Tekening volgens documentenlijst 1239 S05
 - Materialcodes vops bijbehorende materialenlijst 1239 S05 of bestekboek
 - Materialcodes gelden voor het gehele vlak, tenzij anders aangegeven.
 - P= 0 = bovenkant afgewerkte begane grondvloer = XXX+ NAP
 - Grondwaterstand XXX+ NAP, bron: XXX, d.d.DDMMJJJJ
 - Eventueel getekende losse inrichting valt buiten het bouwkundig bestek, tenzij anders aangegeven.
 - Voorroepervaktes volgens NEN 2560
 - Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten, vrije doorgang en drempelhoogten voldoen aan de eisen zoals vermeld in onderstaande ark
 - Projecten vergund volgens Bouwbesluit 2012: art. 4.21, 4.22 en 4.27
 - Projecten vergund volgens BBL: Bestaande bouw: art. 3.59 en 3.59a
 - maatvoering vloerpakketten ter plaatse van de vloer
 - Te openen ramen en deuren met draai- en/of scharnierende deuren
 - scheiding 30 minuten WBDOBO
 - scheiding 60 minuten WBDOBO
 - ruimte scheiding
 - maximaal toelaatbare totale tolerantie constructie in aangegeven richting
 - materialen uitlijnen (voorkant = voorkant, flush)
 - materialisatiecode: XX.XX.YY (XX.XX=NL-SIB code, YY=volgnummer)
 - kozijnmerk: X.YYY.ZZZ (X=soort, YYY=type, ZZZ=volgnummer)
 - bestaande onderdelen
 - buiten bestek
 - installatietechnische componenten, voor alle installatietechnische specificaties, tekeningen en berekeningen zie documenten installatie adviseur
 - loopteur indicatie

eerste verdieping

○ = locatie boring

uitgevoerd op maandag 16 oktober
om 07:00 uur

CONCEPT

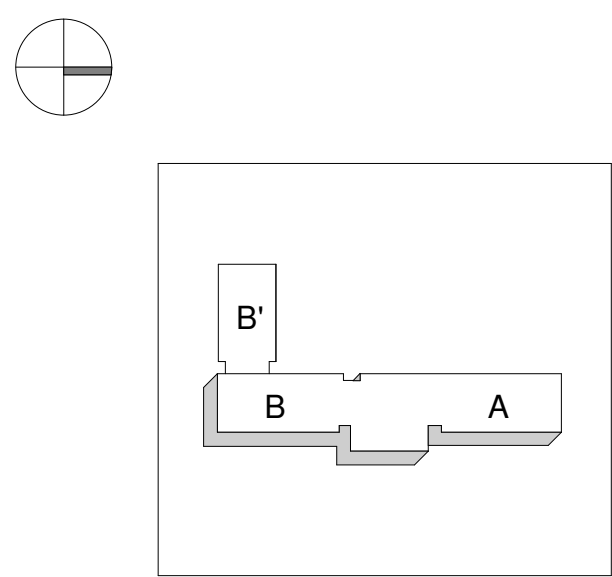

architectenbureau
cepezed b.v.

ezeveldlaan 61
2611 tv delft nl
t +31 15 215 0000
post@cepezed.nl
www.cepezed.nl

opdrachtgever
cepezed

werk
VU AB vleugel


fase
definitief ontwerp
datum
24-04-2023
schaal
1:100
formaat
A1XL2
getekend
tan
gecontroleerd
IVO
gewijzigd

tekening
eerste verdieping


1239
L(--)
04

cepezed

4e verdieping

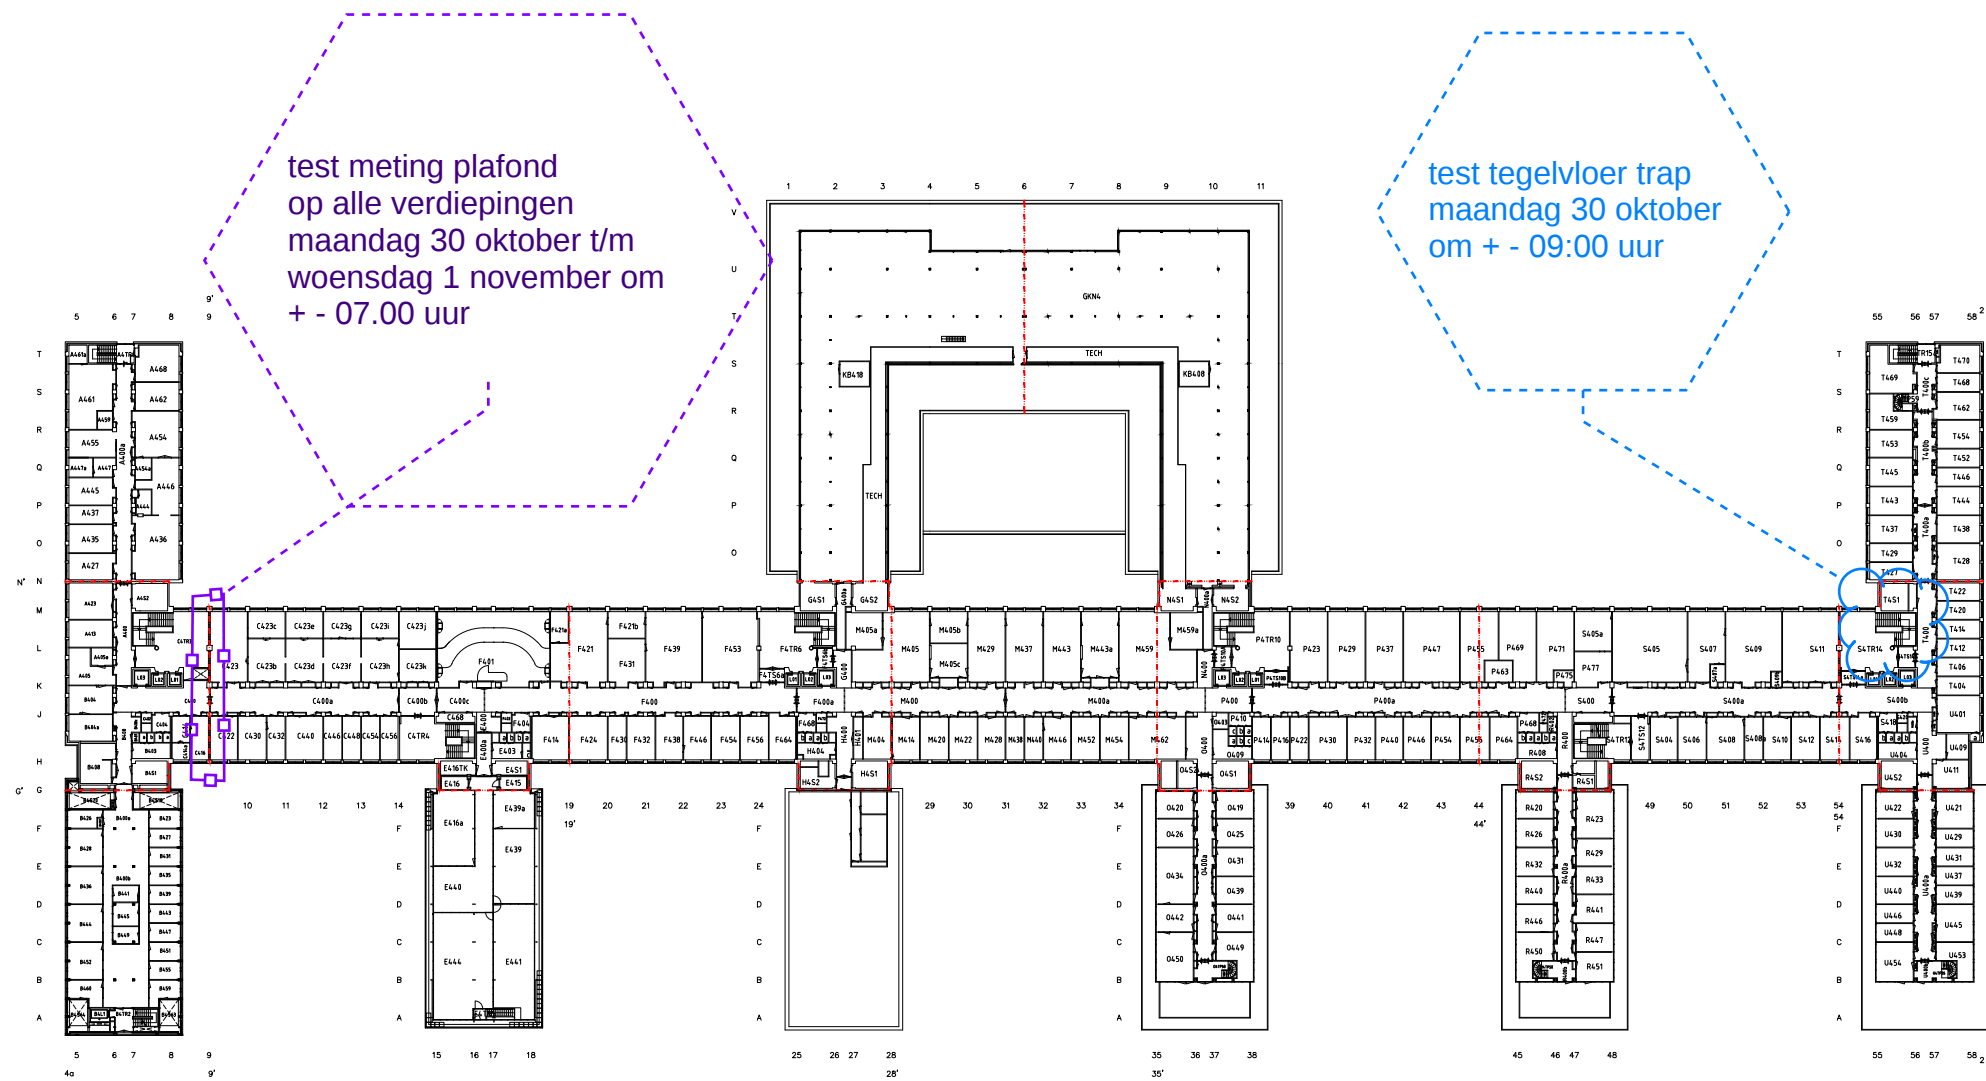

----- Scheidingslijn ruimten
- - - - - Dilatatievoeg



Ruimteboek

24004tot



VRIJE
UNIVERSITEIT
AMSTERDAM

Facilitaire Campus Organisatie (FCO)
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Laatste Rev.:	22-02-2018
Inhoud:	Wis- & Natuurkunde Faculteit 4e verdieping

De inrichting op de tekeningen is informatief, de situatie ter plaatse kan na het tot stand komen van deze tekening gewijzigd zijn.
